

## ДОГОВОР №42-К/15

на выполнение работ по устройству алюминиевых перегородок и дверных блоков.

г. Иркутск

«21» сентября 2015 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Дудина Петра Евлампьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «СтройТехМонтаж», именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Филиппова Андрея Анатольевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», по результатам проведенного Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницей запроса цен (котировок) (протокол № 42-К/15 от «11» сентября 2015 года), заключили настоящий Договор о нижеследующем:

### 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется **выполнить работы по устройству алюминиевых перегородок и дверных блоков** (далее - Работы), а Заказчик берет на себя обязательства принять работы и уплатить за них определенную настоящим Договором денежную сумму (цену).

1.2. Срок (период) выполнения работ: в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента заключения договора.

1.3. Условия выполнения работ: Работы выполняются в соответствии с локальным ресурсным сметным расчетом.

Работы выполняются в режиме работы Заказчика: в рабочие дни. По графику согласованному между Заказчиком и Подрядчиком.

1.4. Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям действующих СНиП, ТУ, ГОСТ и других нормативных документов в соответствии с действующим законодательством.

1.5. Место выполнения работ: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница. г. Иркутск, микрорайон Юбилейный, 100, холл 6 блока, 2 этаж.

1.6. Срок предоставления гарантий качества работ не менее 3 (трех) лет со дня подписания приемочной комиссией Акта о приемке выполненных работ (ф. № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (ф. № КС-3), а именно 3 (три) года.

### 2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

#### 2.1. Заказчик вправе:

2.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

2.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии со Сметной документацией и Договором.

2.1.3. Контролировать соответствие выполняемых Подрядчиком строительно-монтажных работ, применяемых конструкций, изделий, материалов и поставляемого оборудования проектным решениям, требованиям строительных норм и правил, техническим регламентам, стандартам и другим нормативным документам.

2.1.4. Проверять наличие документов, удостоверяющих качество используемых конструкций, изделий и материалов (сертификатов, технических паспортов и т.д.).

2.1.5. Контролировать исполнение Подрядчиком указаний и предписаний органов государственного строительного контроля, а также требований технического надзора.

2.1.6. Участвовать в проверках и приемочных комиссиях проверок качества выполненных работ, проводимых органами государственного надзора и строительного контроля, а также представителями Заказчика;

2.1.7. Истребовать у Подрядчика все сертификаты качества использованных материалов и оборудования с гарантийными обязательствами на них.

2.1.8. Отказаться от приемки результата Работ в случаях, предусмотренных Договором и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.

2.1.9. Отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения ущерба, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению обязательств по Договору или выполняет Работы настолько медленно, что окончание их к сроку, указанному в Договоре, становится явно невозможным.

2.1.10. Осуществлять контроль и надзор за ходом работ Подрядчика на любой стадии, производить фото- и видеофиксацию производства работ. Совместно с представителем Подрядчика осуществлять технический

контроль, производить проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования, сертификатов безопасности для жизни и здоровья людей, соблюдением сроков выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика, назначив для этого представителя.

2.1.11. Пользоваться иными правами, установленными Договором и законодательством Российской Федерации.

## 2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Обеспечить приемку выполненных Работ.

2.2.2. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения Работ, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.

2.2.3. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные Работы в соответствии с Договором.

2.2.4. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Подрядчиком в ходе исполнения обязательств по Договору.

2.2.5. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

## 2.3. Подрядчик вправе:

2.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки Работ по Договору на основании представленных Подрядчиком отчетных документов и при условии истечения срока, указанного в пункте 3.4. Договора.

2.3.2. Требовать своевременной оплаты надлежащим образом выполненных и принятых Работ в соответствии с пунктом 4.4. Договора.

2.3.3. Требовать уплаты неустойки в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором.

2.3.4. Получать от Заказчика содействие при оказании Работ в соответствии с условиями Договора.

2.3.5. Досрочно исполнить обязательства по Договору с согласия Заказчика.

## 2.4. Подрядчик обязан:

2.4.1. Своевременно и надлежащим образом выполнить Работы и представить Заказчику отчетную документацию по итогам исполнения Договора.

2.4.2. Представить по письменному запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.

2.4.3. Выполнить работы по Договору в строгом соответствии со Сметной документацией, требованиями законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов, регулирующих предмет Договора, условиями Договора и приложений к нему, включая индивидуальные особенности Объекта, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам, техническим регламентам и т.п.).

2.4.4. При оформлении (подготовке, разработке) необходимой предусмотренной Договором документации руководствоваться законодательством Российской Федерации и требованиями Заказчика.

2.4.5. Выполнять работы в сроки, установленные Договором.

2.4.6. В случае наличия у Заказчика обоснованных замечаний по выполненным работам в дополнительно установленные Заказчиком сроки устранять их за свой счет.

2.4.7. По требованию Заказчика представлять документы, удостоверяющие качество конструкций, изделий и материалов (сертификаты соответствия, технические паспорта, гарантийные талоны, декларации о соответствии, государственные таможенные декларации - при использовании материалов и оборудования иностранного производства и т.д.), используемых в капитальном ремонте Объекта.

2.4.8. Обеспечивать соответствие выполняемых Работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

2.4.9. Гарантировать качество используемых материалов, наличие сертификатов и других документов, удостоверяющих их качество.

2.4.10. Использовать материалы, необходимые для выполнения работ, которые будут новыми, современными и высокого качества. При выполнении работ Подрядчик может при согласовании с Заказчиком использовать материалы, комплектующие и оборудование соответствующие техническим характеристикам и ГОСТУ (эквивалент), указанные в сметной документации Заказчика.

2.4.11. Исполнять указания и предписания органов государственного строительного контроля, а также требования технического надзора.

2.4.12. Участвовать в проверках и приемочных комиссиях проверок качества выполненных работ, проводимых органами государственного надзора и строительного контроля, а также представителями Заказчика.

2.4.13. Извещать Заказчика обо всех случаях аварийного состояния на Объекте, объемах и стоимости работ по ликвидации аварий.

2.4.14. Нести установленные Договором гарантийные обязательства, обеспечить устранение недостатков и

- дефектов, выявленных при сдаче-приемке Работ и в течение гарантийного срока, за свой счет.
- 2.4.15. Выполнить в полном объеме все иные предусмотренные действующим законодательством, Договором и приложениями к нему обязательства, предполагающие создание и передачу в эксплуатацию готового Объекта.
- 2.4.16. В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» Подрядчик принимает на себя добровольное обязательство о соблюдении требований строительных норм и правил, технических условий и других нормативных документов, действующих на момент заключения договора и добровольное обязательство о выполнении работ с качеством, соответствующим вышеперечисленным документам.
- 2.4.17. Выполнить работы с соблюдением законодательства РФ по охране труда, правил и норм безопасности СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», безопасной эксплуатации машин и механизмов, используемых при выполнении работ, инструкций по безопасности, государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, гигиеническим и санитарным нормативам, с обязательным проведением Подрядчиком ежедневного инструктажа о методах работ, последовательности их выполнения и необходимых средствах индивидуальной защиты.
- 2.4.18. При выполнении работ обеспечить строгое соблюдение ППБ-01-03 «Правила пожарной безопасности при производстве работ в РФ». ГОСТ 12.1.004-91\* «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования». Ответственность за пожарную безопасность на объекте выполняемых работ в полном объеме возлагается на Подрядчика. Экологические мероприятия должны соответствовать требованиям действующих нормативных правовых актов РФ, а также предписаниям надзорных органов. Мероприятия по охране труда: охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты ГОСТ 12.4.011-89 «ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация», мероприятиями по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства). Ведение журнала проверки техники безопасности и охраны труда обязательно. Опасные зоны должны быть обозначены знаками безопасности и надписями установленной формы в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026-2001 «ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности». Ответственность за сохранность материалов, машин и оборудования на объекте выполняемых работ возлагается на Подрядчика.
- 2.4.19. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Договором.

### 3. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

- 3.1. Выполнение работ осуществляется не позднее даты, предусмотренной п.1.2 настоящего Договора.
- 3.2. Приемка выполненных работ в части соответствия их объема и качества требованиям, установленным в Договоре, производится Заказчиком по окончании срока выполнения работ.
- 3.3. После завершения выполнения Работ, предусмотренных Договором, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о факте выполнения Работ.
- 3.4. Не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем получения Заказчиком уведомления, указанного в пункте 3.3. Договора, Подрядчик представляет Заказчику комплект отчетной документации: Акт сдачи-приемки выполненных работ по форме № КС-2, справку о стоимости выполненных работ и затрат (ф. № КС-3), подписанные Подрядчиком в 2 (двух) экземплярах, документы, подтверждающие качество используемых материалов при выполнении работ, а также гарантийное письмо с гарантийным сроком не менее 3 (трех) лет на выполненные работы.
- 3.5. Не позднее 3 (трех) рабочих дней после получения от Подрядчика документов, указанных в пункте 3.4. Договора, Заказчик рассматривает результаты, осуществляет приемку работ на предмет соответствия их объема и качества требованиям Договора.
- 3.6. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений в отношении результатов выполненных Работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных Работ, или акта с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных Работ или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков, устранить полученные от Заказчика замечания, недостатки и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, а также повторный подписанный Подрядчиком Акт о приемки выполненных работ по форме КС-2, Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком выполненных Работ.
- 3.7. В случае если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки, Заказчиком будет принято решение об устранении Подрядчиком недостатков в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов относительно представления разъяснений в

отношении выполненных Работ, Заказчик принимает выполненные Работы и подписывает 2 (два) экземпляра Акта о приемке работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, по одному экземпляру которых направляет Подрядчику.

3.8. Подписанные Заказчиком и Подрядчиком Акт сдачи-приемки выполненных работ по форме № КС-2, справка о стоимости выполненных работ и затрат (ф. № КС-3), и предъявленный Подрядчиком Заказчику счет на оплату Цены Договора являются основанием для оплаты Подрядчику выполненных Работ.

3.9. Обязательства Подрядчика по выполнению Работ, предусмотренных Договором, считаются выполненными с момента подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и передачи ему предусмотренных Договором документов, до получения которых Заказчик, вправе не подписывать документы, подтверждающие факт выполнения работ.

3.10. Претензии по качеству выполненных работ принимаются Подрядчиком в течение всего срока гарантии на выполненные работы.

#### **4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ**

4.1. Цена Договора составляет 278 000,00 (двести семьдесят восемь тысяч) рублей (00) копеек.

4.1.1. Цена договора включает: сметную стоимость выполняемых работ в текущих ценах с учетом всех расходов, определяемых в соответствии с «Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004)» Госстроя России, в том числе: затрат на уплату налога на добавленную стоимость и других обязательных платежей, стоимость материалов, то есть является конечной.

4.1.2. Цена договора является фиксированной на протяжении всего срока исполнения договора.

4.2. Расчеты производятся безналичным способом, в рублях, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

4.3. В случае изменения своего расчетного счета Подрядчик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня направить Заказчику Дополнительное соглашение к Договору на изменение реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Подрядчика, несет Подрядчик.

4.4. Оплата по контракту производится платежным поручением Заказчика на указанный в контракте расчетный счет Подрядчика. Заказчик производит оплату по контракту по факту выполнения работ в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания Акта о приемке выполненных работ (ф.№ КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (ф. № КС-3).

4.5. Датой оплаты для целей настоящего Договора признается день списания соответствующей суммы денежных средств с расчетного счета Заказчика.

4.6. Заказчик вправе уменьшить размер платежа по Договору на сумму неустойки (штраф, пени), подлежащей оплате Подрядчику за нарушение сроков выполнения работ, за ненадлежащее исполнение Договора.

#### **5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, установленных настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательств. Размер неустойки (штрафа, пеней) составляет 0,2 % от суммы неисполненных обязательств.

5.3. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

5.4. Уплата штрафных санкций не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств в натуре.

5.5. В случае просрочки исполнения обязательств Заказчиком Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательств в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

5.6. Стороны не несут ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Заказчик и Подрядчик не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

5.7. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

#### **6. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА**

6.1. Настоящий Договор подписан сторонами « 21 » сентября 2015 г.

6.2. Настоящий Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его подписания и действует до момента полного выполнения сторонами обязательств, кроме случаев его досрочного расторжения, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством. Окончание срока действия Договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.

6.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны сторонами. Под письменной формой подразумеваются также сообщения, направленные с использованием факсимильной связи. Стороны взаимно обязуются признавать юридическую силу документов, переданных посредством факсимильной связи при условии представления в дальнейшем оригиналов таких документов.

6.4. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора в случае ненадлежащего исполнения Договора в порядке, предусмотренном гражданским законодательством РФ.

6.5. Под ненадлежащим исполнением Договора понимается:

- выполнение работ, не соответствующих условиям Договора;

- просрочка исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором свыше 15 календарных дней;

- нарушение Заказчиком сроков и порядка оплаты, установленных Договором.

6.6. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора другая сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

6.7. Недействительность какого-либо из условий Договора не влечет за собой недействительность других условий или всего Договора в целом.

## 7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

7.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают возникшие после заключения Договора такие обстоятельства, которые невозможно было предвидеть либо предотвратить любыми доступными мерами и обладающие признаками чрезвычайности и непредотвратимости.

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся включая, но не ограничиваясь, природные явления (пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия и т.д.), общественные явления (террористический акт, распоряжение компетентных органов власти, запрещающие совершать действия, предусмотренные обязательством и т.д.) при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.

7.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах. Если от Стороны не поступает иных письменных уведомлений, другая Сторона продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от обстоятельств непреодолимой силы.

7.4. Если, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени действия этих обстоятельств и их последствий.

7.5. К обстоятельствам непреодолимой силы не относятся обстоятельства, повлекшие задержку поставки товара на таможне, по причине не представления Поставщиком необходимых документов, в случае если Поставщик знал (должен был знать) о необходимости представления соответствующих документов таможенным органам.

## 8. СПОРЫ

8.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны могут стремиться разрешать дружеским путем в порядке досудебного разбирательства: путем переговоров, письмами и др.

8.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Иркутской области.

8.3. Стороны обязуются незамедлительно извещать друг друга обо всех изменениях своих адресов и реквизитов.

8.4. Стороны берут на себя обязательства по правильному и своевременному оформлению документации по настоящему Договору.

## 9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.2. Все Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

## 10 ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

10.1. Приложение №1 – Локальный ресурсный сметный расчет;

10.2. Приложение №2 – Ведомость основных материалов;

10.3. Приложение №3 – Дефектная ведомость;

10.4. Приложение №4 – План 6 блока , 2 этаж (холл) ГБУЗ «ИОКБ».

## 11. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

### Заказчик

Государственное бюджетное учреждение  
здравоохранения  
Иркутская ордена «Знак Почета»  
областная клиническая больница

Адрес: 664049, г. Иркутск, мкр. Юбилейный,  
100  
ИНН 3812014690  
КПП 381201001  
БИК 042520001

### Подрядчик

Общество с ограниченной ответственностью  
«СтройТехМонтаж»

Адрес: 665816, Иркутская область, г. Ангарск,  
30-й мкр., дом 6, офис 11  
ИНН: 3801121563  
КПП: 380101001  
БАНК: Филиал «Газпромбанк» (АО) в г.  
Иркутске  
БИК 042520731  
р/сч.: 40702810400350000861  
ОКПО 27251078  
ОКТМО 25603101  
Дата постановки на учет в налоговом органе:  
26.10.2012

Главный врач ГБУЗ «ИОКБ»

М.П.



/П.Е.Дудин /

Директор ООО «СтройТехМонтаж»

М.П.



/А.А. Филиппов/



**ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на устройство алюминиевых перегородок в холле 6 блок, 2 этаж  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 326,890 тыс. руб /1,17499 =278,000 тыс.руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 34,857 тыс. руб. (понижающий коэффф. 1,17499)

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 182,96 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_\_\_\_ 2 кв. 2015 г. \_\_\_\_\_

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.				Т/з осн. раб.	Т/з мех.		
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе				Мат	
								Осн.З/п	Эк.Маш.				З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Раздел 1. Новый Раздел</b>													
Перегородки в гардеробе													
1	ГЭСН46-04-006-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка деревянных перегородок: чистых щитовых дощатых (Транспортные расходы МАТ=1,3%)	100 м2		0,195 10,5/100	5823,78	1135,64	836,8	298,84	220,44		5,71	1,33
		Затраты труда рабочих (ср 1,6)	чел.час	29,3	5,71	146,46	836,29	836,29					
		Затраты труда машинистов	чел.час	6,84	1,33								
	1. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	6,84	1,33	224,05	297,99		297,99	219,81			
2	ГЭСН09-03-046-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Монтаж перегородок: из алюминиевых сплавов сборно-разборных с остеклением (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Транспортные расходы МАТ=1,3%)	100 м2		0,195 10,5/100	77468,26	15106,31	14200,33	905,98	134,28		72,84	0,54
		Затраты труда рабочих (ср 4,3)	чел.час	373,543	72,84	194,95	14200,16	14200,16					
		Затраты труда машинистов	чел.час	2,75	0,54								

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	2,75	0,54	868,31	468,89		468,89	135,22			
	2. 030404	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	54,875	10,7	35,93	384,45		384,45				
	3. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,35	0,07	818,68	57,31		57,31				
7		Перегородки алюминиевые - остекленные (Транспортные расходы МАТ=1,3%)	м2		13	3646,8	47408,4				47408,4		
8		Перегородки алюминиевые глухие с панелями сэндвич (Транспортные расходы МАТ=1,3%)	м2		5,1	2188,08	11159,21				11159,21		
9		Оконные створки: остекленные (Транспортные расходы МАТ=1,3%)	м2		1,4	4609,15	6452,81				6452,81		
Окна, двери													
3	<b>ГЭСН46-04-012-03</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных (Транспортные расходы МАТ=1,3%)	100 м2		0,0831 8,31/100	18024,12	1497,8	1353,7	144,1	106,3		8,63	0,64
		Затраты труда рабочих (ср 2,4)	чел.час	103,91	8,63	156,77	1352,93	1352,93					
		Затраты труда машинистов	чел.час	7,74	0,64								
	1. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	7,74	0,64	224,05	143,39		143,39	105,77			
4	<b>ГЭСН46-04-012-02</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок (Транспортные расходы МАТ=1,3%)	100 м2		0,01 1/100	28731,36	287,31	269,97	17,34	12,79		1,73	0,08
		Затраты труда рабочих (ср 2,4)	чел.час	172,76	1,73	156,27	270,35	270,35					
		Затраты труда машинистов	чел.час	7,74	0,08								
	1. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	7,74	0,08	224,05	17,92		17,92	13,22			
6	<b>ГЭСН10-01-047-01</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 (МДС35-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Транспортные расходы МАТ=1,3%)	100 м2 проемов		0,0831 8,31/100	44068,16	3662,06	3297,73	364,33	18,03		19,21	0,11
		Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.час	231,15	19,21	171,68	3297,97	3297,97					
		Затраты труда машинистов	чел.час	1,3125	0,11								
	1. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,3125	0,11	224,05	24,65		24,65	18,18			
	2. 134041	Шуруповерт	маш.-ч	26,1375	2,17	4,7	10,2		10,2				
	3. 331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	40,2625	3,35	7,8	26,13		26,13				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	4,4625		0,37	818,68	302,91		302,91				
17		Дверной блок с встроенными створками 800*800 (Д-4) (Транспортные расходы МАТ=1,3%)	м2			2,26	6951,41	15710,19				15710,19		
20		Дверные блоки (Транспортные расходы МАТ=1,3%)	м2			6,05	5888,44	35625,06				35625,06		
13	ГЭСН10-01-034-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Транспортные расходы МАТ=1,3%)	100 м2 проемов			0,01 1/100	450209,51	4502,1	421,07	46,25	3,64	4034,78	2,48	0,02
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	248,492		2,48	169,45	420,24	420,24					
		Затраты труда машинистов	чел.час	2,2		0,02								
	1. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одностачные, высота подъема 45 м	маш.-ч	2,2		0,02	224,05	4,48		4,48	3,31			
	2. 134041	Шуруповерт	маш.-ч	28,6125		0,29	4,7	1,36		1,36				
	3. 331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	44,0875		0,44	7,8	3,43		3,43				
	4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	4,4625		0,04	818,68	32,75		32,75				
	5. 203-9096	Блоки оконные пластиковые	м2	100		1	3983	3983				3983		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах							142546,89	20379,6	1776,84	495,48	120390,45	110,6	2,72	
Накладные расходы							15863,9							
Сметная прибыль							11455,82							
<b>Итого по разделу 1 Новый Раздел :</b>														
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)							7106,75					16,07	2,05	
Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)							98281,51					72,84	0,54	
Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)							64478,35					21,69	0,13	
<b>Итого</b>							169866,61					110,6	2,72	
<b>В том числе:</b>														
Материалы							120390,45							
Машины и механизмы							1776,84							
ФОТ							20875,08							
Накладные расходы							15863,9							
Сметная прибыль							11455,82							
<b>Итого по разделу 1 Новый Раздел</b>							169866,61					110,6	2,72	
<b>Раздел 2. перегородки пост охраны</b>														
Перегородки														

Гранд-СМЕТА


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	<b>ГЭСНр56-2-2</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	разборка перегородки остекленной (Транспортные расходы МАТ=1,3%)	100 м2 оконных переплетов		0,132 13,2/100	7372,94	973,23	945,73	27,5	20,29		6,09	0,12
		Затраты труда рабочих (ср 2,3)	чел.час	46,11	6,09	155,38	946,26	946,26					
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,93	0,12								
	1. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,93	0,12	224,05	26,89		26,89	19,83			
11	<b>ГЭСН09-03-046-01</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Монтаж перегородок: из алюминиевых сплавов сборно-разборных с остеклением (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Транспортные расходы МАТ=1,3%)	100 м2		0,1574 15,74/100	77468,26	12193,5	11462,22	731,28	108,39		58,8	0,43
		Затраты труда рабочих (ср 4,3)	чел.час	373,543	58,8	194,95	11463,06	11463,06					
		Затраты труда машинистов	чел.час	2,75	0,43								
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	2,75	0,43	868,31	373,37		373,37	107,68			
	2. 030404	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	54,875	8,64	35,93	310,44		310,44				
	3. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,35	0,06	818,68	49,12		49,12				
19		Перегородки алюминиевые - остекленные (Транспортные расходы МАТ=1,3%)	м2		7	4901,91	34313,37				34313,37		
18		Перегородкиалюминиевые глухие с панелями сэндвич (Транспортные расходы МАТ=1,3%)	м2		6,6	2188,08	14441,33				14441,33		
15		Оконные створки: остекленные (Транспортные расходы МАТ=1,3%)	м2		2,16	4609,15	9955,76				9955,76		
5	<b>ГЭСН46-04-012-03</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных (Транспортные расходы МАТ=1,3%)	100 м2		0,0223 2,23/100	18024,12	401,94	363,27	38,67	28,53		2,32	0,17
		Затраты труда рабочих (ср 2,4)	чел.час	103,91	2,32	156,77	363,71	363,71					
		Затраты труда машинистов	чел.час	7,74	0,17								
	1. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	7,74	0,17	224,05	38,09		38,09	28,1			
12	<b>ГЭСН10-01-047-01</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Транспортные расходы МАТ=1,3%)	100 м2 проемов		0,0223 2,23/100	632925,06	14114,23	884,95	97,77	4,84	13131,51	5,15	0,03


## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.час	231,15	5,15	171,68	884,15	884,15					
		Затраты труда машинистов	чел.час	1,3125	0,03								
	1. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,3125	0,03	224,05	6,72		6,72	4,96			
	2. 134041	Шуруповерт	маш.-ч	26,1375	0,58	4,7	2,73		2,73				
	3. 331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	40,2625	0,9	7,8	7,02		7,02				
	4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	4,4625	0,1	818,68	81,87		81,87				
	5. 203-9065	Блоки дверные входные пластиковые	м2	100	2,23	5813	12962,99				12962,99		
14	<b>ФССЦпг01-01-041</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (Транспортные расходы МАТ=1,3%)	1 т груза		0,45	727,22	327,25	163,62	163,63				
16	<b>ФССЦпг03-02-01-025</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 25 км I класс груза (Транспортные расходы МАТ=1,3%)	1 т груза		0,45	263,28	118,48		118,48				
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах							86839,09	13819,79	1177,33	162,05	71841,97	72,36	0,75
Накладные расходы							9809,23						
Сметная прибыль							7767,56						
<b>Итого по разделу 2 перегородки пост охраны :</b>													
Проемы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.6; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.6; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)							2125,7				6,09	0,12	
Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)							85558,14				58,8	0,43	
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)							987,68				2,32	0,17	
Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)							15298,63				5,15	0,03	
Погрузо-разгрузочные работы							327,25						
Перевозка грузов автотранспортом							118,48						
<b>Итого</b>							<b>104415,88</b>				<b>72,36</b>	<b>0,75</b>	
В том числе:													
Материалы							71841,97						
Машины и механизмы							1177,33						
ФОТ							13981,84						
Накладные расходы							9809,23						
Сметная прибыль							7767,56						
<b>Итого по разделу 2 перегородки пост охраны</b>							<b>104415,88</b>				<b>72,36</b>	<b>0,75</b>	
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>													

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							229385,98	34199,39	2954,17	657,53	192232,42	182,96	3,47
Накладные расходы							25673,13						
Сметная прибыль							19223,38						
<b>Итого по смете:</b>													
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)							8094,43					18,39	2,22
Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)							183839,65					131,64	0,97
Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)							79776,98					26,84	0,16
Проемы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.6; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.6; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)							2125,7					6,09	0,12
Погрузо-разгрузочные работы							327,25						
Перевозка грузов автотранспортом							118,48						
<b>Итого</b>							<b>274282,49</b>					<b>182,96</b>	<b>3,47</b>
<b>В том числе:</b>													
Материалы							192232,42						
Машины и механизмы							2954,17						
ФОТ							34856,92						
Накладные расходы							25673,13						
Сметная прибыль							19223,38						
Непредвиденные затраты 1%							2742,82						
<b>Итого с непредвиденными</b>							<b>277025,31</b>						
НДС 18%							49864,56						
<b>ВСЕГО по смете</b>							<b>326889,87</b>					<b>182,96</b>	<b>3,47</b>

Составил: инж.стр. отдела  М.М. Аверченко  
(должность, подпись, расшифровка)


Проверил: нач. стр. отдела  Т.В. Оленикова  
(должность, подпись, расшифровка)

## ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ МАТЕРИАЛОВ

на устройство алюминиевых перегородок в холлу 6 блок, 2 этаж ГБУЗ "ИОКБ"  
Приложение №2 к Договору №42-К/15 от "\_\_\_"\_\_\_2015г

№ пп	Код ресурса	Наименование ресурса	Ед.изм.	Кол.
1	2	3	4	5
<b>Ресурсы подрядчика</b>				
<b>Материалы</b>				
<b>Гардероб</b>				
1	Перегордки	Алюминиевые глухие с панелями сэндвич 24 мм, цвет белый	м2	5,1
2	перегородки	Перегородки алюминиевые, остекленные, цвет белый стекло тонированное -5 мм	м2	13
3	Оконные створки	Встроенные в алюминиевые перегородки 840*840 (2х створчатые) стекло тонированное -5мм, 2 комплекта	м2	1,4
4	Дверной блок	Из алюминиевого профиля в комплекте, с панелями сэндвич глухие)с встроенными створками (Д-4) с порогом, цвет белый (1130*2000)	м2	2,26
5	Дверной блок	Из алюминиевого профиля в комплекте, цвет белый с порогом (Д-2 =2 шт, Д-3=2 шт)	м2	6,05
	Оконный блок	Из ПВХ: поворотнo-откидной механизм, цвет белый в комплекте, одностворчатое	м2	1
<b>Пост охраны</b>				
6	Перегордки	Алюминиевые глухие с панелями сэндвич 24 мм, цвет белый	м2	6,6
7	перегородки	Перегородки алюминиевые, остекленные, цвет белый. Стекло тонированное-5мм	м2	7
8	Оконные створки	Встроенные в алюминиевые перегородки 840*840	м2	2,16
9	Дверной блок	Из алюминиевого профиля в комплекте заполнение-панели сэндвич 24 мм, цвет белый с порогом (Д-1)(глухая)	2	2,23

Составил: инж.стр. отдела



М.М. Аверченко



УТВЕРЖДАЮ: директор ГБУЗ "ИОКБ"

Д.С. Бортник

Приложение №3 к Договору №42-К/15 от "21" 09 2015г.

## ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

На устройство алюминиевых перегородок в холле 6 блок, 2 этаж

№ пп	Наименование дефектов	метод устранения дефектов	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2		3	4	6
<b>Раздел 1. Новый Раздел</b>					
Перегородки в гардеробе					
1	Облицовка перегородки дермантином износилась (порвалась), листы ДСП выкрашиваются -износ 100%	Разборка деревянных перегородок: чистых щитовых дощатых	100 м2	0,195 19,5/100	
2	Взамен разбираемых	Монтаж перегородок: из алюминиевых сплавов сборно-разборных с остеклением	100 м2	0,195 19,5/100	
7	Верх перегородок	Перегородки алюминиевые - остекленные	м2	13	
8	Низ перегородок	Перегородкиалюминиевые глухие с панелями сэндвич	м2	5,1	
9	оконные створки 850*840 =2 шт	Оконные створки:остекленные	м2	1,4	
Окна, двери					
3	Облицовка из ДВП на дверных блоках деформировалась, на дверной коробке в районе устаовке замка -брусоч раскрошился	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных	100 м2	0,0831 8,31/100	
4	Деревянные створки деформировались	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2	0,01 1/100	
6	Взамен разбираемых	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,0831 8,31/100	
17	Окно для студентов	Дверной блок с встроенными створками 800*800 (Д-4)	м2	2,26	
20		Дверные блоки	м2	6,05	


1	2		3	4	6
13	Взамен разбираемых	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0,01 1/100	
<b>Раздел 2. перегородки пост охраны</b>					
Перегородки					
10	Морально и физически устарела	разборка перегородки остекленной	100 м2 оконных переплетов	0,132 13,2/100	
11	Взамен разбираемых	Монтаж перегородок: из алюминиевых сплавов сборно-разборных с остеклением	100 м2	0,1574 15,74/100	
19	Верх перегородок	Перегородки алюминиевые - остекленные	м2	7	
18	Низ перегородок	Перегородки алюминиевые глухие с панелями сэндвич	м2	6,6	
15	Окно встраиваемое в перегородки для охраны	Оконные створки: остекленные	м2	2,16	
5	Облицовка из ДВП на дверных блоках деформировалась, на дверной коробке в районе устаовке замка -брусок раскрошился	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,0223 2,23/100	
12	Взамен разбираемых	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,0223 2,23/100	

Составил: инж.стр. отдела

  
(должность, подпись, расшифровка)

М.М. Аверченко

Проверил: нач.стр. отдела

  
(должность, подпись, расшифровка)

Т.В. Олейникова

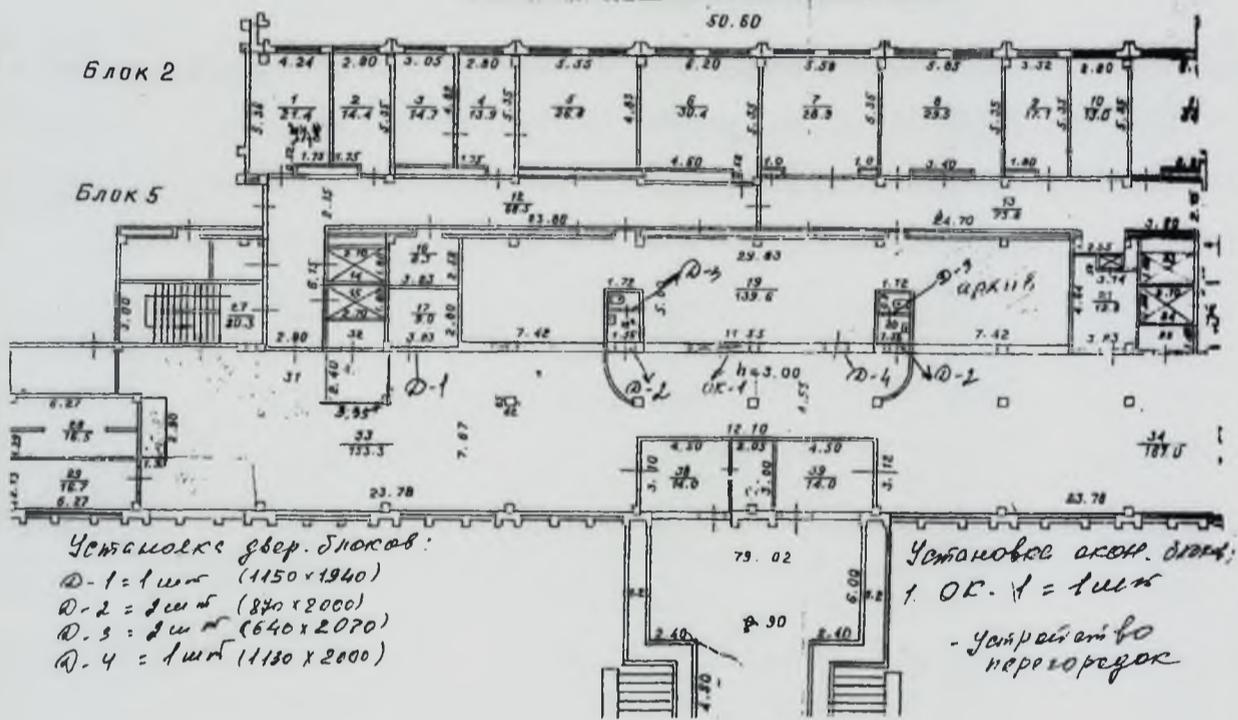
Применение ДН к  
 Фомберу № 42-К/15 от  
 "21" сентября 2015г

2-й этаж

Литер

Блок 6 - холл.

Устройство перегородок



Установке дверей блоков:  
 D-1 = 1 шт (1150 x 1940)  
 D-2 = 2 шт (840 x 2000)  
 D-3 = 2 шт (640 x 2070)  
 D-4 = 1 шт (1130 x 2000)

Установке окон. блок:  
 1 ОК. 1 = 1 шт  
 - устройство перегородок
